TERVEGYEZTETÉSI ÉS TULAJDONOSI NYILATKOZAT

Tárgy: Kaposvár közép 8 FTTH kiviteli terve

Tervszám: 1000006610

Építtető: Magyar Telekom Nyrt. 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.

Építési mód: új optikai kábel építése

Érintett telek: Kaposvár 2091 HRSZ

Tulajdonos adatai:

Jogállás: társasháztulajdon
Cím: 7400 Kaposvár, Virág utca 10.

Képviselő:

Neve: Erdélyi V Miklósné közös képviselő
E-mail: erdelyizsuzsa@vipmail.hu
Telefon: +36 70 609 7915


A képviselő nyilatkozata:

A társasház kezelőjeként nyilatkozok, mint a 2003. évi C. tv. 99/B. § szerinti épületen belüli fizikai infrastruktúrával rendelkezni jogosult személy, hogy a tárgyi telken és épületen az alábbi műszaki megoldássokkal járulok hozzá az építéshez.

Műszaki megoldás:

Az utcán a járdában lévő alépítmény csőben épül az új optikai kábel. Az épület gépkocsibejárója előtt van egy alépítmény szekrény. Ebből a szekrényből tervezzük az épület optikai ellátását. A szekrényből jelenleg van egy réz kábel az épületbe. A kapubejáró jobb sarkánál van réz kábeles csatlakozó doboz, melybe két gége cső csatlakozik. A csövek lehet, hogy használhatók az alépítmény szekrény és az erősáramú elosztó szekrények között. Ha az optika behúzható ezekbe a csövekbe, akkor a bejárati térkő burkolat nem kerül felbontásra, a meglévő csöveket használjuk.

A tervezett építés helyszín rajza:

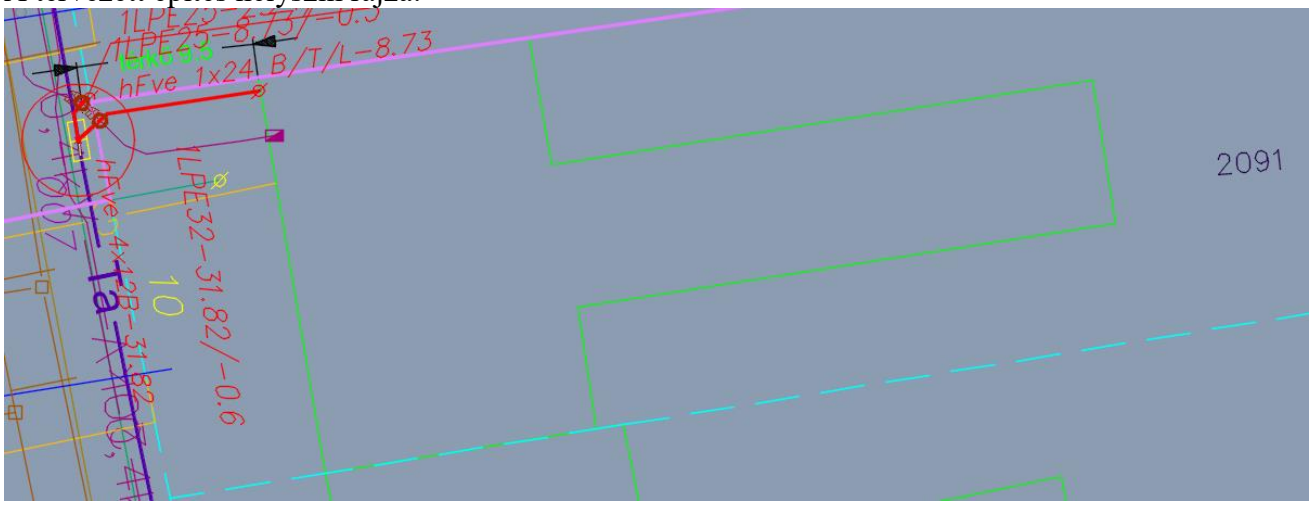

A járdában lévő alépítmény szekrénytől a térkő felbontásával LPE 32 csövet épünk és a kapu mögött felállunk a falra. A tető részen a meglévő kaputelefon és kapunyitó kábel mellett vezetjük a kábelt. A kapu nyitó elektromos kábel mellett vezetjük be az erősáramú elosztó szekrénybe.





Az optikai kábel függőleges vezetését az erősáramú elosztó szekrényekben lévő gyengeáramú csövezésben tervezzük. Az épületen belül a szinti optikai csatlakozó dobozokat az erősáramú elosztó szekrényekben helyezzük el.





Szolgáltatási igény esetén a lakások bekapcsolása az erősáramú szekrényekben elhelyezendő dobozokból történik. Ennek a szakasznak az építése nem része a projektnek.

A burkolatokat eredeti állapotuknak megfelelően kell helyreállítani. Károkozás esetén a helyreállítási költség a kivitelezőt terheli.

A munkavégzés megkezdése előtt a kezelőt értesíteni kell.

Kaposvár, 2026. 08. „ …..”

…….
képviselő
